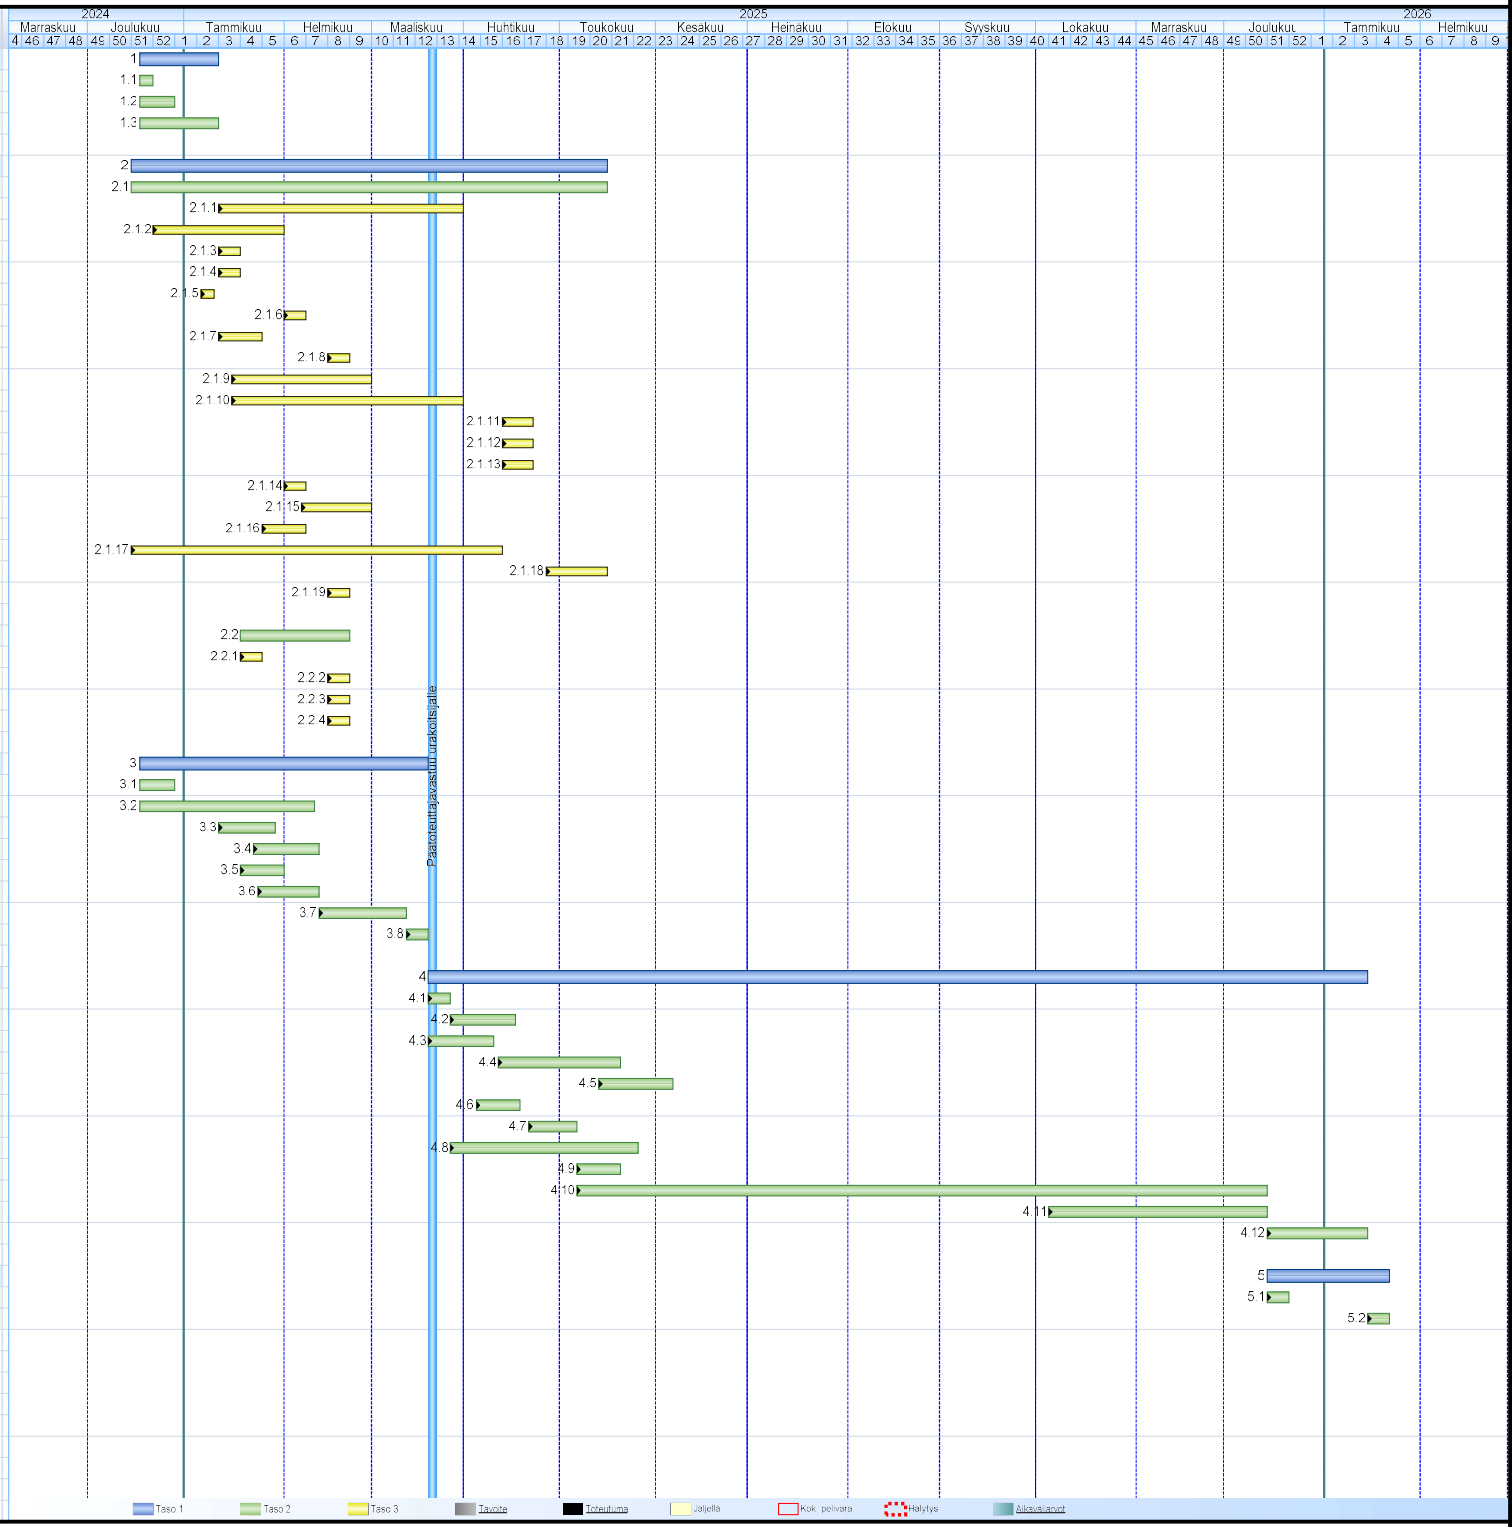	Hier	Nimi	Kesto	Aik. alku
1	-1	Toimintojen alasajo	13 pv	18.12.24
2	1.1	BV 101 (II-tehdas)	3 pv	18.12.24
3	1.2	BV 105	5 pv	18.12.24
4	1.3	BV 106	13 pv	18.12.24
6	-2	Wärtsilä muutto ja purkuja	101 pv	16.12.24
7	-2.1	BV101 (II-tehdas)	101 pv	16.12.24
8	2.1.1	Siltanosturipurku BV101	56 pv	13.01.25
9	2.1.2	Metanolirunkolinjan tyhjennys /laitteistopurku	25 pv	23.12.24
10	2.1.3	Kemikaalikaappien tyhj.	5 pv	13.01.25
11	2.1.4	Leikkuukone nesteet tyhj.	5 pv	13.01.25
12	2.1.5	Kaasuhälytyskeskuksen irtikytkennät	3 pv	07.01.25
13	2.1.6	Paineilmaverkoston alasajo	5 pv	03.02.25
14	2.1.7	ATEX-alueet kanavapuhdistukset	10 pv	13.01.25
15	2.1.8	Sprinkleri alasajo ???	5 pv	17.02.25
16	2.1.9	Automaatio muutokset ja alasajot (backup-virta?)	32 pv	16.01.25
17	2.1.1	Tietoverkon ja UPS:en alasajo ja siirto	53 pv	16.01.25
18	2.1.1	Vesi irtikytkentä	5 pv	14.04.25
19	2.1.1	Sähkö irtikytkentä (tark. tietoverkko tulee olla siirretty)	5 pv	14.04.25
20	2.1.1	Kaukolämpöirtikytkentä	5 pv	14.04.25
21	2.1.1	Palohälytysjärjestelmän irtikytkentä	5 pv	03.02.25
22	2.1.1	Teräsosien ja -rakenteiden purku	16 pv	07.02.25
23	2.1.1	Kalusteiden ja varusteiden purku/luovutus	10 pv	27.01.25
24	2.1.1	Raskasöljylinjojen ja tankkien pesu	80 pv	16.12.24
25	2.1.1	Öljynerotuskaivojen poisto	13 pv	28.04.25
26	2.1.1	BV105 mahd. IV-kone ym purku sisällä	5 pv	17.02.25
28	-2.2	BV105 ja BV106	25 pv	20.01.25
29	2.2.1	Siltanosturipurku BV105	5 pv	20.01.25
30	2.2.2	Vesi irtikytkentä	5 pv	17.02.25
31	2.2.3	Sähkö irtikytkentä	5 pv	17.02.25
32	2.2.4	Kaukolämpöirtikytkentä	5 pv	17.02.25
34	-3	Purkutöiden valmistelu ja suunnittelu	61 pv	18.12.24
35	3.1	Purkulupahakemuksen jättö	5 pv	18.12.24
36	3.2	Purkuluvan käsittely ja luvan liitteiden päivitykset	35 pv	18.12.24
37	3.3	Asbestikartoitusten suorittaminen ja täydennykset	13 pv	13.01.25
38	3.4	Purkuselvityksen laadinta	15 pv	23.01.25
39	3.5	Muut haitta-aineselvitykset koskien purkua	10 pv	20.01.25
40	3.6	Purku-urakan tarjouspyyntöasiakirjat	14 pv	24.01.25
41	3.7	Purku-urakan laskenta ja tarvittavat neuvottelut	20 pv	13.02.25
42	3.8	Purku-urakan urakkasopimus	5 pv	13.03.25
44	-4	Purkutyöt	207 pv	20.03.25
45	4.1	Purkualueen aitaaminen ja liikennejärjestelyt (vaihe-1	5 pv	20.03.25
46	4.2	BV105 rakennuspurku	15 pv	27.03.25
47	4.3	BV106 asbesti- ja sisäpurku	15 pv	20.03.25
48	4.4	BV106 rakennuspurku	25 pv	11.04.25
49	4.5	Betonijätteen murskaus ja varastointi 1.erä	16 pv	14.05.25
50	4.6	Teräsrunkopurku piha-alueella (kaasurunkolinja)	10 pv	04.04.25
51	4.7	Mahdollinen piha-alueen purku rak. edessä BV101	10 pv	22.04.25
52	4.8	BV101 asbesti- ja sisäpurkutyöt	40 pv	27.03.25
53	4.9	Jäähdytysvesilinjan sulku ja sihtipurku (+linjan täyttö	10 pv	07.05.25
54	4.10	BV101 rakennuspurku	156 pv	07.05.25
55	4.11	Betonijätteen murskaus ja varastointi 2.erä	50 pv	06.10.25
56	4.12	Maisemointi	20 pv	15.12.25
58	-5	Purkutöiden vastaanotto	25 pv	15.12.25
59	5.1	Vastaanottotarkastus koskien rakennuspurkuja	5 pv	15.12.25
60	5.2	Jälkitarkastus ja maisemoinnin hyväksyntä	5 pv	15.01.26
